


Anlage 3

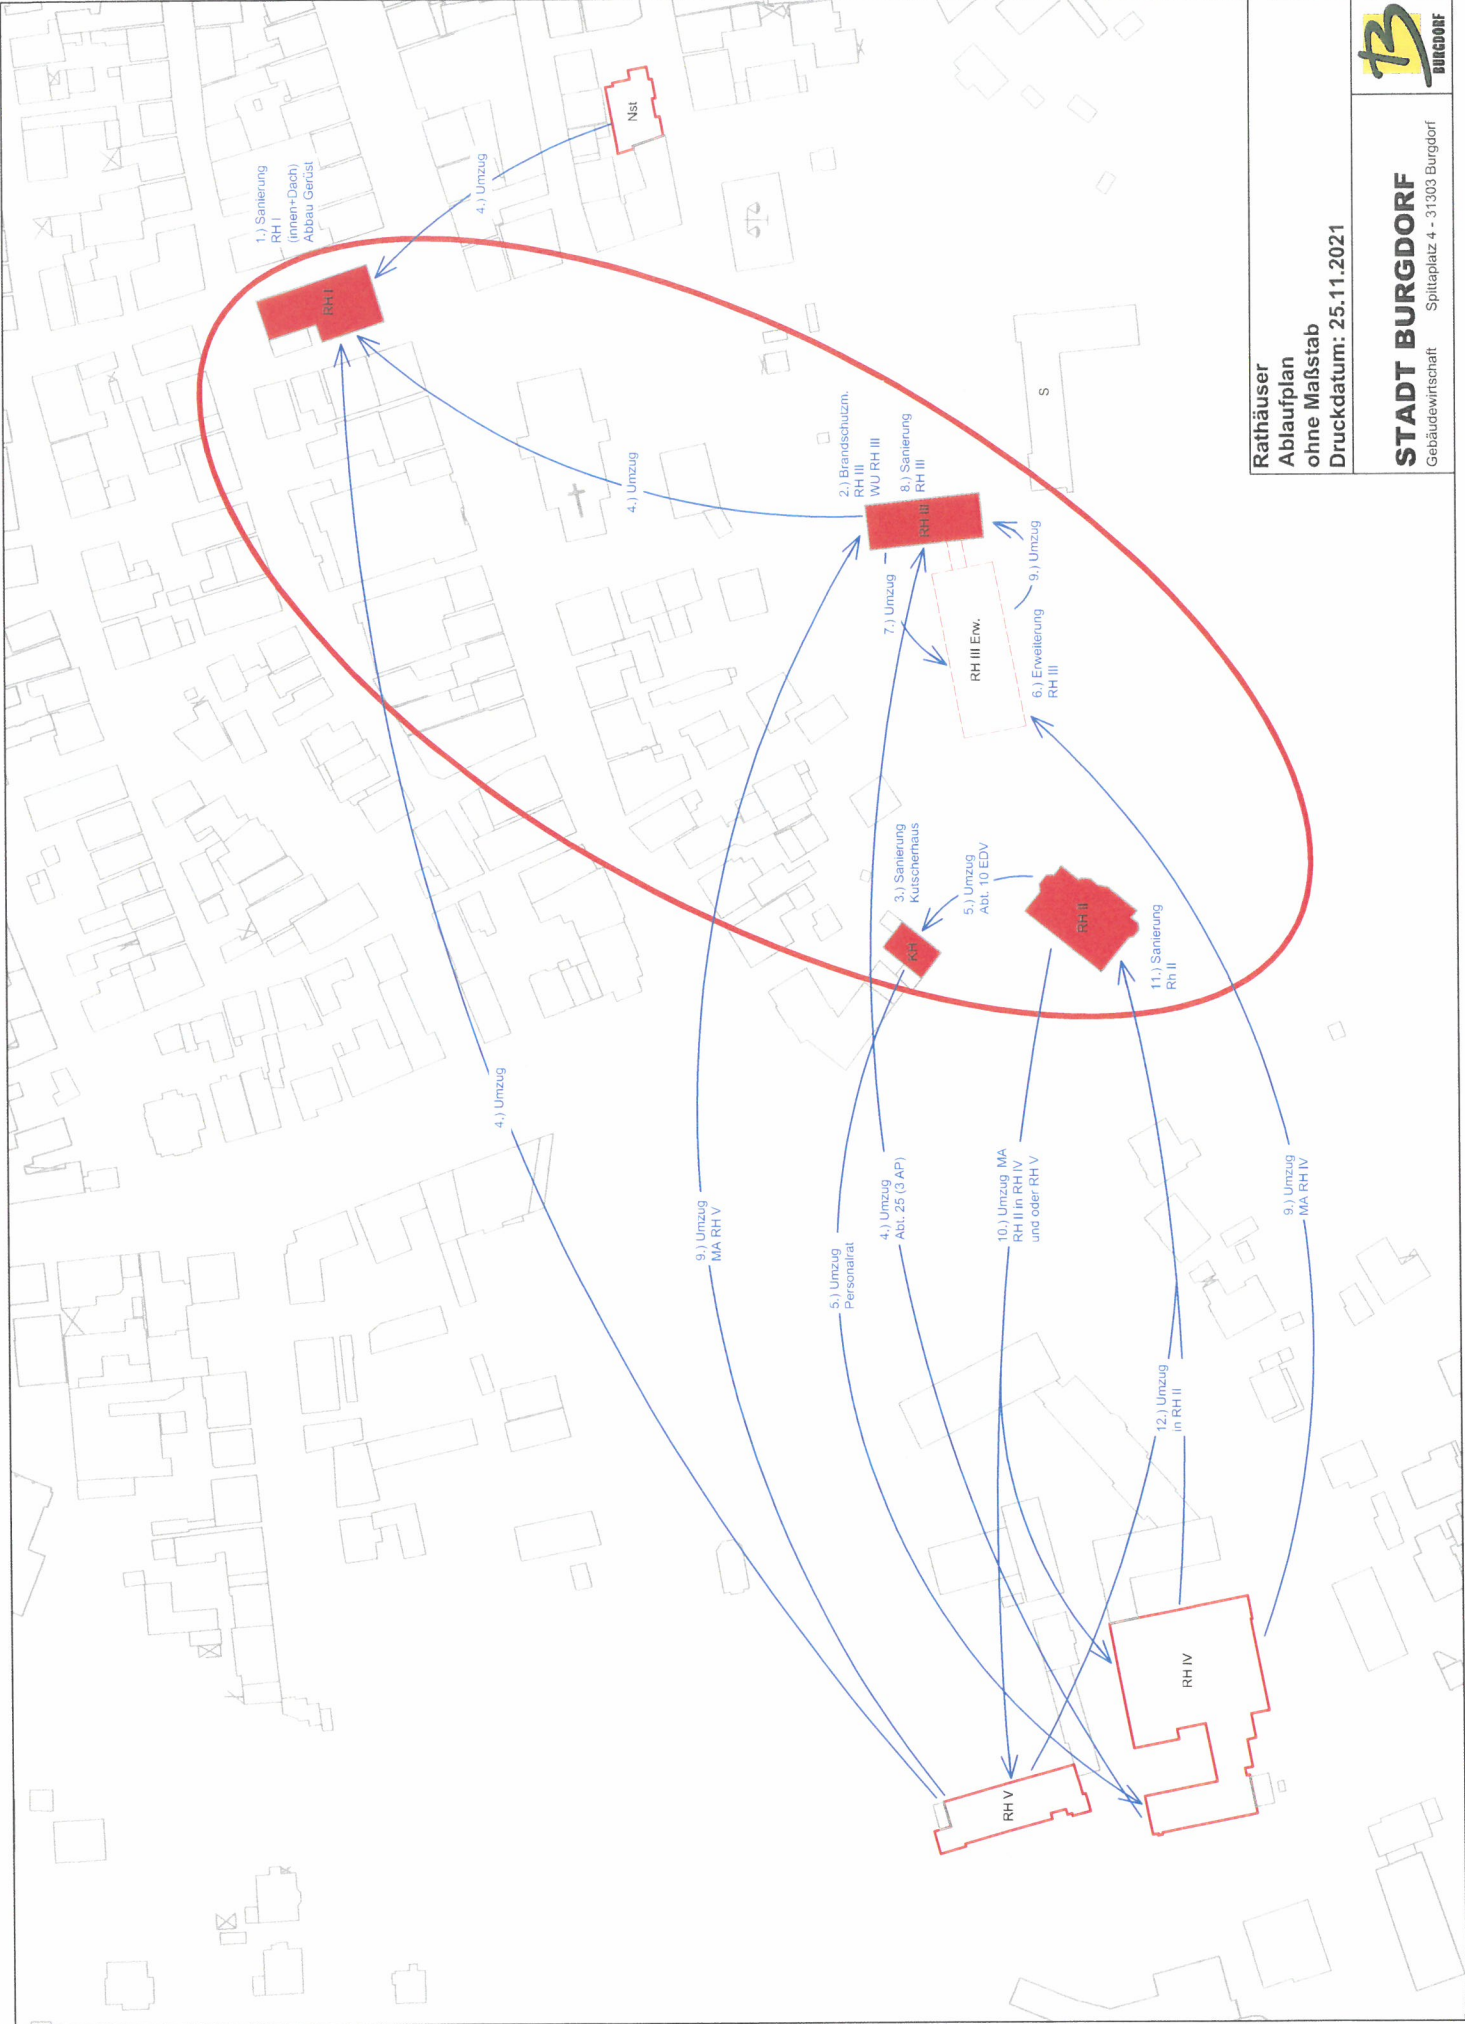

Rathäuser
Ablaufplan
ohne Maßstab
Druckdatum: 25.11.2021

Erläuterungen zum Ablaufplan

1) Sanierung des Rathauses I

**2) Parallel: Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen im Rathaus III und
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung**

zur Aufrechterhaltung des Betriebs und zur Ausweitung der Nutzbarkeit. Im 2. Obergeschoss ist die Nutzung derzeit auf 10 Personen durch das Fehlen des zweiten baulichen Rettungsweges beschränkt.

3) Sanierung des Kutscherhauses zur Einrichtung einer IT-Zentrale

4) Umzug der Abteilungen in das Rathaus I mit Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen

5) Umzug des Personalrates in das Rathaus IV (bis zur Bereitstellung der Räume im RH IV wird eine Zwischenlösung mit dem Personalrat abgestimmt – vorübergehende Nutzung Homeoffice/Sitzungszimmer)

6) Erweiterung/Anbau an das Rathaus III

7) Mit Fertigstellung des Anbaus, Umzug der im Rathaus III verbliebenen Abteilungen in den neuen Anbau / abhängig von den zur Verfügung stehenden Raumkapazitäten
Umzug des Rathauses IV oder V in den Anbau

8) Sanierung oder Neubau des Rathauses III

(abhängig von der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung)

9) Umzug des Rathauses IV und/oder V in den Anbau zum Rathaus III/in das Bestandsgebäude RH III

10) Umzug der Mitarbeiter/innen des RH'es II in das Rathaus IV oder V

11) Sanierung des Rathauses II

12) Umzug der Mitarbeiter/innen des RH'es II in das Rathaus II
