"NEUBAU GUDRUN-PAUSEWANG-GRUNDSCHULE IN BURGDORF"

GESTALTUNG AUSSENANLAGEN



ZEITLICHER ABRISS

2014 Erarbeitung Vorentwurf

Arbeitskreis / Hr. Basedow Clark


2015 Entwurfsplanung SFP

Konkretisierung / Erarbeitung Entwurf ab Mai 2015

- 1. Workshop mit Schulen / Variantenabstimmung
 mit Einarbeitung der Ergebnisse
 14.07./ 16.07. 2015
- Abstimmung mit Feuerwehr 06.08./ 08.12. 2015
- 2. Workshop mit Schulen: Vorstellung aktualisierter Entwurf / Abstimmung der Planung
- Aktualisierung Entwurf: Einarbeitung der Ergebnisse des Workshops / Optimierung
 04.02. 2016


VORENTWURF


Jürgen Basedow Clark

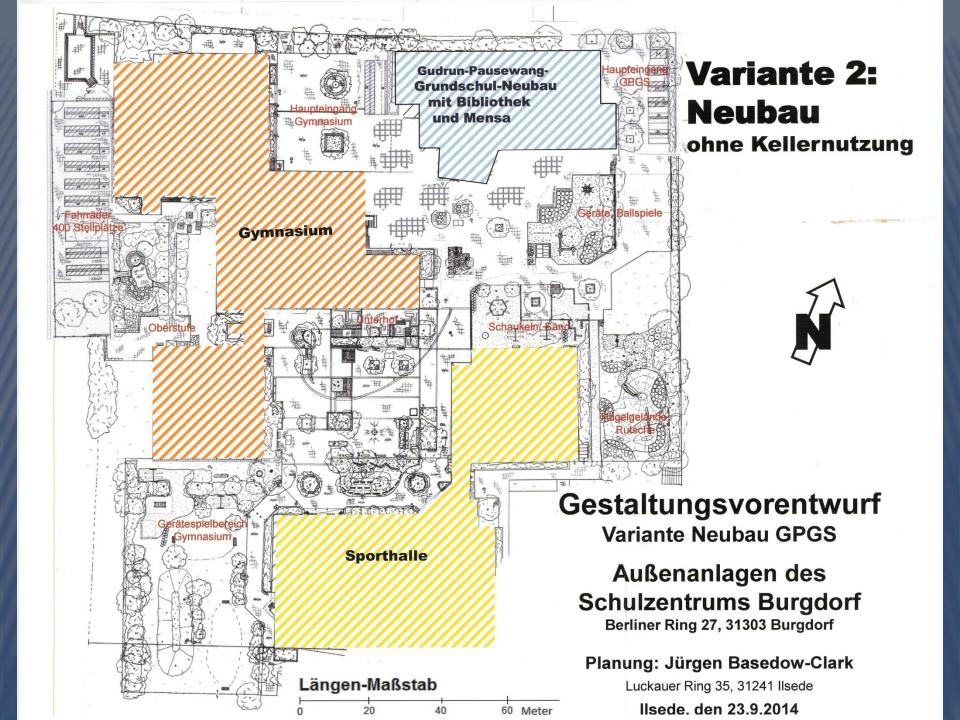


ENTWURF


Sport- und Freiraumplanung Dipl. Ing. Dieter Grundmann, Garten- und Landschaftsarchitekt

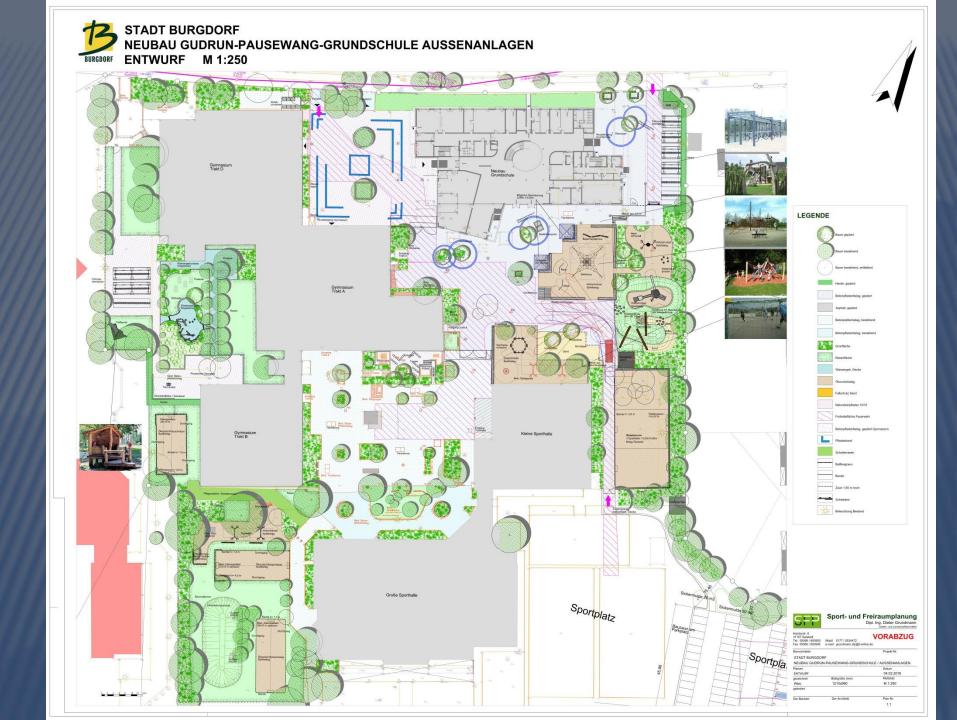

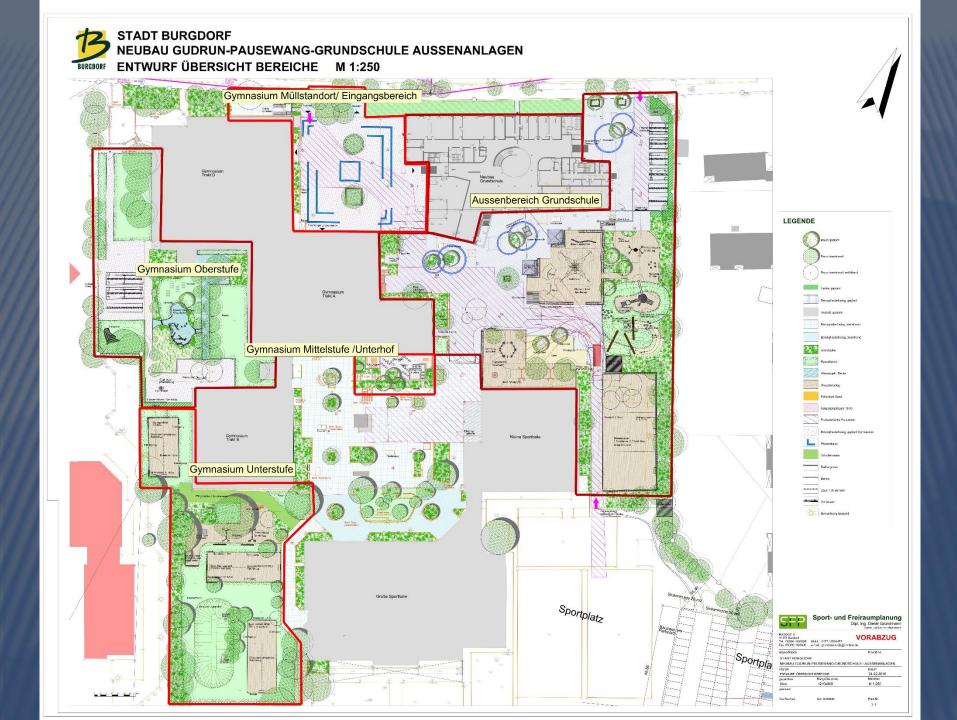



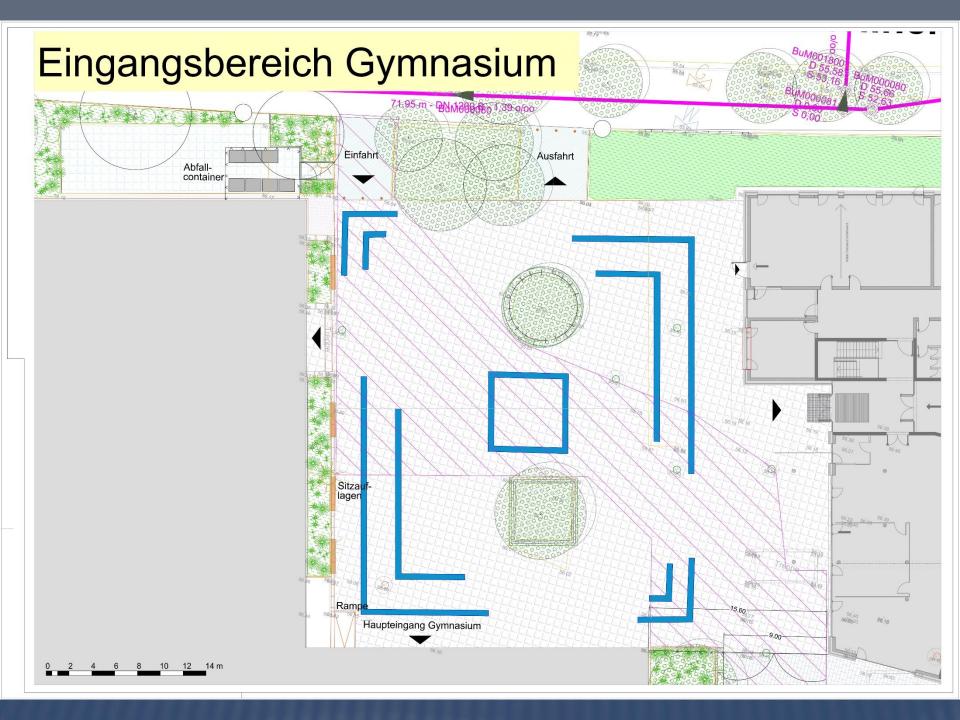

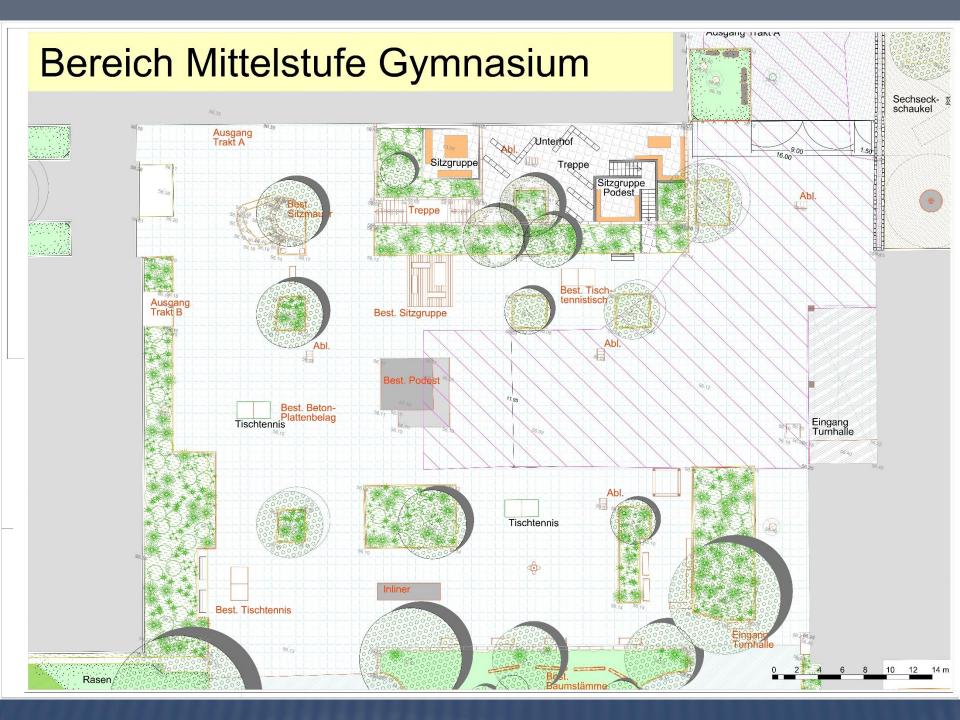






Erläuterung

| | Angemeldete Haushaltsmittel auf Grundlage Vorentwurf 2014 | Kostenberechnung zum Entwurf | Differenz |
|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Brutto einschl. Mehrwertsteuer | Brutto einschl. Mehrwertsteuer | Brutto einschl. Mehrwertsteuer |
| Gymnasium | 142.800€ | 568.000€ | - 425.200 € |
| Grundschule | 486.400€ | 688.000€ | - 201.600 € |
| Fahrradstellplatz | 328.000€ | 233.000 € | 95.000€ |
| Summe | 957.200€ | 1.489.000€ | - 531.800 € |
| + Nebenkosten 20% | 191.440€ | 297.800€ | - 106.360 € |
| Gesamtsumme | 1.149.000€ | 1.786.800€ | - 637.800 € |


- Differenz setzt sich zusammen aus:
- Baubedingte Mehrkosten (406.560 €)
- Kosten für Pflasterarbeiten, Herstellung Schulhof durch Baustelleneinrichtung, Lagerplatz für Kran, Leitungstrassen
- Entwässerung, Beleuchtung für Fahrradstellplätze, Rampen, Fallschutz
- Mehrkosten durch zusätzliche Ergänzungen (231.600 €)
- Spielburg, Zaun, Sitzplatzüberdachung, Eingangsbereich, Kleinspielfelder, Treffpunkt

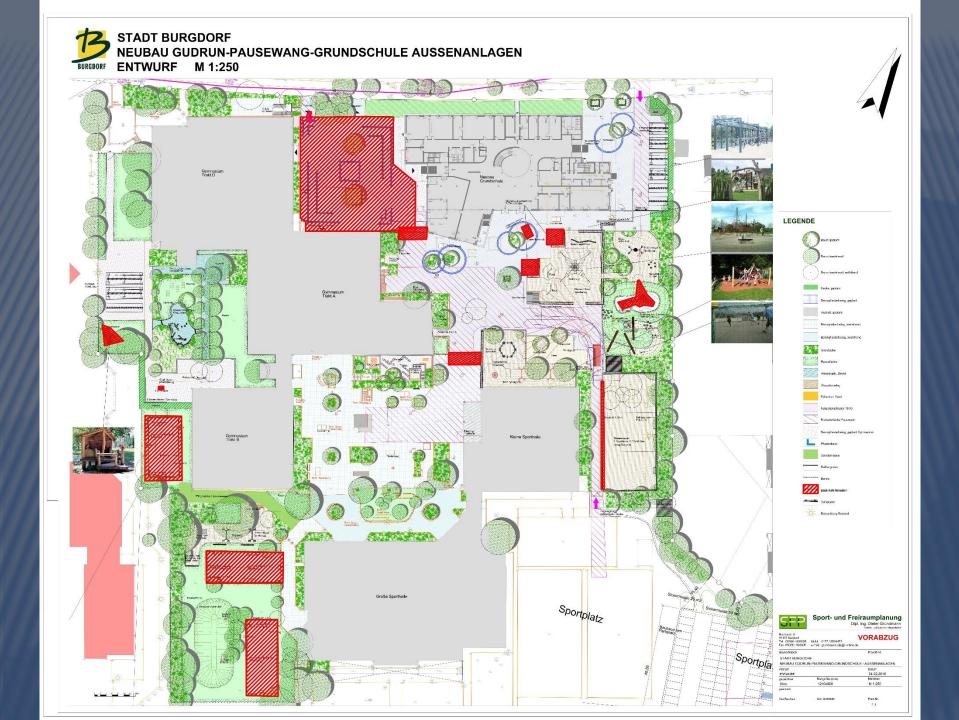

| Zusätzliche Kosten Gymnasium Ergänzungen | Kosten Brutto einschl. Mehrwertsteuer |
|---|---------------------------------------|
| Neugestaltung Eingangsbereich 50% | 61.323€ |
| Tischkicker (Oberstufe) | 6.426 € |
| Treffpunkt (Oberstufe) | 7.426 € |
| Sanierung Kleinspielfelder (Unterstufe) | 52.228€ |
| Neubau Kleinspielfeld (Unterstufe) | 30.826€ |
| Summe Gymnasium | 158.229€ |

| Zusätzliche Kosten Grundschule Ergänzungen | Kosten Brutto einschl. Mehrwertsteuer | Prioritäten nach Angaben Grundschule Brutto einschl. Mehrwertsteuer |
|---|--|---|
| Bande am Weg Bolzplatz | 4.284€ | Zwingend notwendig, da Ökocolor als Fallschutz gewünscht wird |
| Spielburg auf Erdhügel | 17.993 € | Priorität 1 |
| Bodentrampolin | 5.712€ | Priorität 2 |
| Überdachung Sitzplätze | 22.848€ | Zwingend notwendig |
| Absicherung Schulhof | 22.562€ | Zwingend notwendig |
| Summe Grundschule | 73.399€ | |



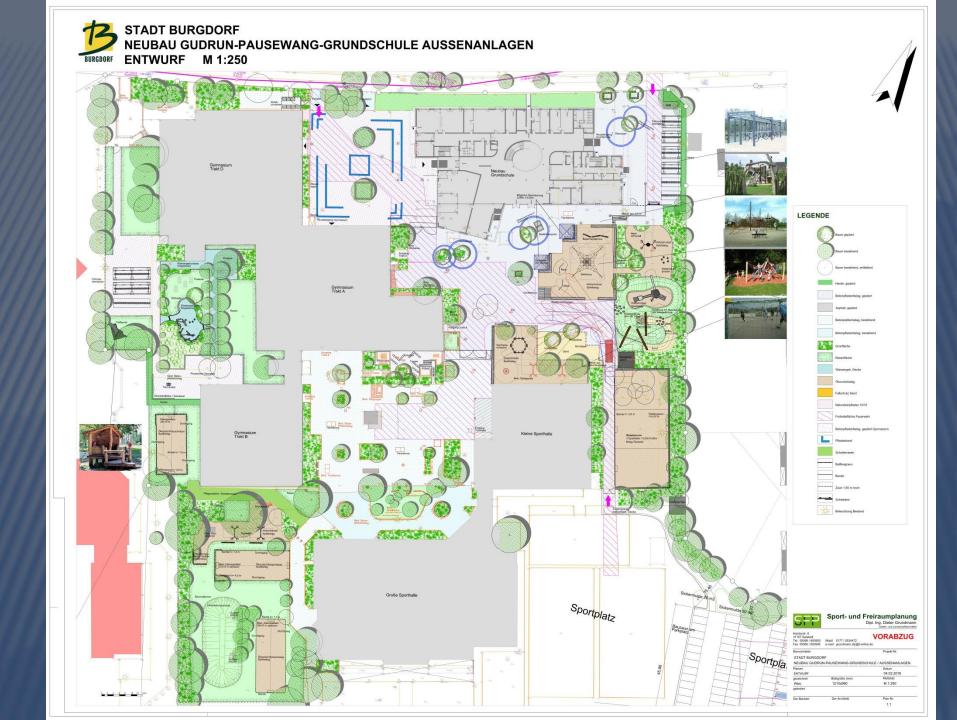

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und einen schönen Abend! Dieter Grundmann
